



DODATEK Č. 1

ke

SMLOUVĚ O PROVEDENÍ STAVBY

„ČOV Lanškroun – Stavební úpravy“

kteřou uzavřely dne 21.3.2022 tyto smluvní strany:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Zastoupené: Ing. Bohuslavem Vaňousem, prokuristou
Se sídlem: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO: 48173398
DIČ: CZ48173398
Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 991
Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Fiedler MBA – výrobně technický náměstek
Číslo smlouvy: SOD/04/22

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost Lanškroun 2022

Se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

Vedoucí společník: **LB 2000, s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem
Se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČO: 64618081
DIČ: CZ 64618081
Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 14167
Je plátcem DPH.

Společník: **INSTAV Hlinsko a.s.**

Zastoupený: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva
Se sídlem: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČO: 25284959
DIČ: CZ 25284959
Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 2631

Číslo účtu: 944562/0800, Česká spořitelna

Číslo smlouvy: 7558/2022/2005

Je plátcem DPH.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

53

I. Předmět dodatku č. 1

- I.1. Smluvní strany se dohodly na provedení méněprací a víceprací dle přiložených změnových listů – Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2 (viz. Příloha č. 1 tohoto dodatku).
- I.2. Bod V.1 Smlouvy o provedení stavby se nahrazuje novým zněním takto:
Celková cena za splnění celého předmětu díla (dále jen „**Sjednaná cena**“) se sjednává takto:

Celková cena dle Smlouvy o provedení stavby:	36 865 162,31 Kč bez DPH
Změnový list č. 1:	- 263 440,46 Kč bez DPH
Změnový list č. 2:	+ 191 747,00 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 1	36 793 468,85 Kč bez DPH

II. Ostatní ujednání dodatku č. 1

- II.1 Smluvní strany se dohodly že ostatní ujednání vlastní smlouvy o provedení stavby zůstávají nezměněny.
- II.2 Dodatek č. 1 smlouvy o provedení stavby nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
- II.3 Dodatek č. 1 smlouvy o provedení stavby je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- II.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- II.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, a č. 2

Za Objednatele:

V Jablonném nad Orlicí dne:



Ing. Bohuslav Vaňous
Ředitel společnosti, prokurista
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí

**Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí**

Ing. Lubomír Fiedler MBA

člen představenstva
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí



Za Zhotovitele

V Olomouci dne:

14.8.2023

LB=2000 s.r.o.
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 316 879
e-mail: technici@lb2000.cz; www.lb2000.cz

Ing. Tomáš Svetko
zmocněný jednatel za společnost Lanškroun 2022

Změnový List		
	Společnost Lanškroun 2022	
Vedoucí Společník: LB 2000, s.r.o U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc IČO: 64618081	„ČOV Lanškroun – stavební úpravy“	Společník: Instav Hlinsko a.s. Tyršova 833, 539 01 Hlinsko IČO: 252 84 959

Změnový list č.01

Název projektu:	„ČOV Lanškroun – stavební úpravy“
Název objednatele	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Název technického dozoru investora:	VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o.
Název zhotovitele:	Společnost Lanškroun 2022

1. Předmět změny

- a) Změna tloušťky štěrkového polštáře pod DZ na 60cm
- b) Propojovací potrubí
- c) Propojení stávajícího potrubí od UV

2. Důvod změny

a) změna tloušťky štěrkového polštáře pod DZ na 60 cm

Dle dokumentace pro provedení stavby měla být tloušťka polštáře zmíněných 60 cm, v rozpočtu dle SoD byl však uveden výpočet odpovídající tloušťce polštáře 120 cm.

b) Propojovací potrubí

V rozpočtu dle SoD nebyly započítány kompletní kubatury těžení dle uvažované PD.

c) Propojení stávajícího potrubí



Oproti předpokladu v PD, se lišila trasa dešťové kanalizace z uličních vpustí podél zdrže. Původní trasa byla v kolizi s nově navrženým objektem zdrže. Muselo dojít k přeložení trasy z důvodu zachování odtokových podmínek dešťových vod okolo zdrže.

Způsob jakým bude změna provedena

- a) Byl proveden štěrkový polštář dle PD, přebývající množství řešeno formou méněprací.
- b) Byl proveden přepočet množství odpovídající PD a skutečnosti.
- c) Byla provedena přeložka úseku který kolidoval s nově navrženou zdrží.

3. Časový harmonogram

- Navrhovaná změna nebude mít časový dopad do výstavby

Změnový List		
	Společnost Lanškroun 2022	
Vedoucí Společník: LB 2000, s.r.o. U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc IČO: 64618081	„ČOV Lanškroun – stavební úpravy“	Společník: Instav Hlinsko a.s. Tyršova 833, 539 01 Hlinsko IČO: 252 84 959

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu

- Vícepráce ve výši – c) Propojení stávajícího potrubí od UV	+ 66 898,32 , - Kč
b) Propojovací potrubí	+ 260 632,04 , - Kč
- Méněpráce ve výši – a) Změna tloušťky šterkového polštáře	- 590 970,82 , - Kč
- Celkové snížení ceny díla o	- 263 440,46- Kč

5. Druh změny

Dle §222 odst. 4 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ZOZVZ 134/2016 Sb.


6. Fotodokumentace

7. Přílohy

Rozpočet



8. Podpisy

Zhotovitel


	Petr Zelinka	 kompletní dodávky inženýrských sítí U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc tel./fax: +420 585 420 067, +420 585 416 878 e-mail: technice@lb2000.cz, www.lb2000.cz
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant


	Ing. Jan Přivratský	 Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.p.a.s.r.o. Na Slezské 1079 500 03 Hradec Králové
datum	jméno	razítko a podpis

	Změnový List	
	Společnost Lanškroun 2022	
Vedoucí Společník: LB 2000, s.r.o U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc IČO: 64618081	„ČOV Lanškroun – stavební úpravy“	Společník: Instav Hlinsko a.s. Tyršova 833, 539 01 Hlinsko IČO: 252 84 959

Technický dozor investora

	Ing. Jiří Forejtek	 Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Na Střežině 1079 500 03 Hradec Králové
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

	Ing. Lubomír Fiedler, MBA	 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350 561 64 Jablonné nad Orlicí
datum	jméno	razítko a podpis

Společnost Lanškroun 2022

Vedoucí společník:
LB 2000, s.r.o.
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČO: 646 18 081

Společník:
Instav Hlinsko a.s.
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČO: 252 84 959

Změnový list

Číslo změnového listu : **1**

Od : Zhotovitel	Společnost Lanškroun 2022				
Komu : Objednatel	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.				
Celkový počet stran :		Celkový počet příloh :			
Stavba :	ČOV Lanškroun - Stavební úpravy				
Objekt :					
Důvod změny, požadavek :	Chybou v PD <input type="checkbox"/>	Záměrem investora, provozovatele, bud. provozovatele <input type="checkbox"/>	Chybou dodavatele <input type="checkbox"/>	Vyšší moci <input type="checkbox"/>	Jinou okolností- uveďte : <input type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto **změnu rozsahu díla a termínů** :

Popis změny :	Změna tloušťky šterkového polštáře pod DZ na 60 cm	-590 970,82 Kč bez DPH
	Propojení stávajícího potrubí od UV	66 898,32 Kč bez DPH
	Propojovací potrubí	260 632,04 Kč bez DPH

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změna sjednané ceny díla o (- odpočet / + navýšení) :	-263 440,46
--	--------------------

Změna sjednané lhůty dokončení díla (- zkrácení / + prodloužení) :	
---	--

Vyjádření zpracovatele PD k výše uvedené změně je přiloženo :	Změnou projektové dokumentace <input type="checkbox"/>	Zápisem v SD <input type="checkbox"/>	Zápisem z KD <input type="checkbox"/>	Jiné (fax,e-mail) <input type="checkbox"/>	Není <input type="checkbox"/>
---	---	--	--	--	----------------------------------

Za zhotovitele zpracoval :	Ing. Michal Široký
Datum :	26.05.2023
Podpis :	

Podpis zmocněnce zhotovitele : LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8 779 00 Olomouc - Holice	Objednatel (oprávněný zástupce objednatele) : Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350 561 64 Jablonné nad Orlicí
Dne :	Dne :

Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo

Zpracoval: Ing. Tomáš Svetko
revize: 2
můlář č.21/Prov

Bez potvrzení změny podle ustanovení Smlouvy o dílo nebude dodavatel objednávat materiál, výrobky apod. a nebude provádět žádné práce, dokud neobdrží potvrzení tohoto tiskopisu ze strany objednatele.
Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo.

Fon

ZL 1

Stavba

ČOV Lanškroun - stavební úprava

Objekt:

Soupis

Soupis víceprací a méněprací

Místo:

Lanškroun

Datum:

08.02.2023

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Jabloně nad Orlicí, a.s.

Projektant:

VIS s.r.o.



Zhotovitel:

Společnost Lanškroun 2022

Zpracovatel:

Společnost Lanškroun 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
			Změna tloušťky štrkového polštáře pod DZ na 60 cm				-590 970,82
22	K	213311131.1	Polštáře zhuštěné pod základy z kamenna drceného frakce 0 až 32 mm Dle SOD Skutečnost 783*0,6 Rozdíl	m3	-469,800	1 257,92	-590 970,82
			Propojení stávajícího potrubí od UV				66 898,32
D 1			Zemní práce				16 938,91
1	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	517,00	1 551,00
2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	3,000	200,18	600,54
3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	84,000	1,94	162,96
			3*28 "Přepočtené koeficientem množství"			84,000	
			Součet			84,000	
4	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	3,000	25,83	77,49
			3			3,000	
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (ekvádovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,150	219,56	1 350,29
			3*2,05 "Přepočtené koeficientem množství"			6,150	
			Součet			6,150	
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	19,500	232,47	4 533,17
			39*1*(0,2+0,3)			19,500	
7	M	58341334	kamenivá drcená frakce 0/2	t	39,000	222,14	8 663,46
			19*5*2 "Přepočtené koeficientem množství"			39,000	
			Součet			39,000	
D 4			Vodorovné konstrukce				5 359,22
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkoplisku	m3	3,900	1 374,16	5 359,22
			39*0,1*1			3,900	
D 8			Trubní vedení				39 150,20
9	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m	39,000	171,00	6 669,00
10	M	28611139	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4	m	25,750	537,00	13 827,75
11	M	28611137	trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4	m	8,240	448,00	3 691,52
12	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	3,090	480,00	1 483,20
13	M	28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m	3,090	597,00	1 844,73
14	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	18,000	284,00	5 112,00
15	M	28611364	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	kus	5,000	186,00	930,00
16	M	28611365	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	kus	5,000	200,00	1 000,00
17	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	8,000	295,00	2 360,00
18	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 200	kus	2,000	471,00	942,00
19	M	28611396	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45°	kus	2,000	645,00	1 290,00
D 99			Přesun hmot				5 449,99
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,962	684,50	5 449,99
			Propojovací potrubí				260 632,04
D 1			Zemní práce				225 751,97
1	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	51,225	258,30	13 231,42
			*Původní rozměry				
			"30% výkopku v hornině tř 1,2"				
			"provazní voda" (28,6*2,6)*0,9*1,6			44,928	
			"odtok" (14*10+3*15+4)*2,2*3,5			354,200	
			"stoka + vodovodní řad v souběhu" 24*2*1,8			86,400	
			"stoka + vodovodní řad samostatně" (6*7,5)*1,1*1,8			26,730	
			Mezisoučet			512,258	
			-512,258*0,2			-102,452	
			"Nová rozměry				
			512,258*0,3			153,677	
			Mezisoučet			51,225	
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	153,678	322,88	49 619,55
			*Původní rozměry				
			"60% výkopku v hornině tř 3"				
			"provazní voda" (28,6*2,6)*0,9*1,6			44,928	
			"odtok" (14*10+3*15+4)*2,2*3,5			354,200	
			"stoka + vodovodní řad v souběhu" 24*2*1,8			86,400	
			"stoka + vodovodní řad samostatně" (6*7,5)*1,1*1,8			26,730	
			Mezisoučet			512,258	
			-512,258*0,3			-153,677	
			"nová rozměry				
			512,258*0,6			307,355	
			Mezisoučet			153,678	
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 3	m3	61,026	71,03	4 334,68
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 3	m3	174,380	200,18	34 909,39
			51,225+153,678-81,026/2			174,380	
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 615,850	1,94	5 074,75
			174,39*15 "Přepočtené koeficientem množství"			2 615,850	
			Součet			2 615,850	
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	174,380	25,83	4 504,49
			174,39			174,390	
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	357,500	219,56	78 492,70
			174,39*2,05 "Přepočtené koeficientem množství"			357,500	
			Součet			357,500	
8	K	174151101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěným	m3	61,026	154,98	9 457,81
			*původní rozměry				
			"výkop-podšyp-bet lože-obesyp"				
			-(512,258-13,64-(2,2*0,25*46)-268,042)			-207,276	
			"nova rozměry				
			512,258-13,64-(2,2*0,25*46)-205,016			268,302	
			Součet			81,026	
9	M	58331200	štrkoplisk nelité záস্যový	t	50,957	512,73	26 127,18
			61,026/2			30,513	
			30,513*1,67 "Přepočtené koeficientem množství"			50,957	
D 99			Přesun hmot				34 880,07
10	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	50,957	684,50	34 880,07

Změnový List		
	Společnost Lanškroun 2022	
Vedoucí Společník: LB 2000, s.r.o U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc IČO: 64618081	„ČOV Lanškroun – stavební úpravy“	Společník: Instav Hlinsko a.s. Tyršova 833, 539 01 Hlinsko IČO: 252 84 959

Změnový list č.02

Název projektu:	„ČOV Lanškroun – stavební úpravy“
Název objednatele	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Název technického dozoru investora:	VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o.
Název zhotovitele:	Společnost Lanškroun 2022

1. Předmět změny

- a) Poklopy nad čerpadla
- b) Jeřábová dráha
- c) Zábradlí

2. Důvod změny

a) Poklopy nad čerpadla

Dle dokumentace pro provedení stavby měla být nad čerpadly sestava kompozitních poklopů. Změna řeší záměnu za kompozitní rošty v nerezovém rámu pro lepší přístup a manipulaci s čerpadly a odvětrání čerpací jímky.

b) Jeřábová dráha

V projektu nebyla jeřábová dráha uvažována. Změna řeší doplnění jeřábové dráhy pro manipulaci s čerpadly. V návaznosti na bezpečnost pracovníků pro manipulaci s čerpadly (hmotnost jednoho čerpadla je přes 300kg bez příslušenství). Požadovaná nosnost dráhy pro břemena do 500 kg.

c) zábradlí



V projektu bylo uvažováno se zároveň pozinkovaným zábradlím. Změna řeší zábradlí v provedení nerez.

Způsob jakým bude změna provedena

- a) Do otvoru bude osazen nerezový rám s kompozitním odnímatelným roštem
- b) Jeřábová dráha bude vyrobena na základě statického výpočtu a výkresu.
- c) Zábradlí bude vyrobeno z nerezi

3. Časový harmonogram

- Navrhovaná změna nebude mít časový dopad do výstavby

Změnový List		
	Společnost Lanškroun 2022	
Vedoucí Společník: LB 2000, s.r.o. U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc IČO: 64618081	„ČOV Lanškroun – stavební úpravy“	Společník: Instav Hlinsko a.s. Tyršova 833, 539 01 Hlinsko IČO: 252 84 959

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu

- Vícepráce ve výši – a) poklopy nad čerpadla	+ 10.918,-	Kč
b) Jeřábová dráha	+ 180.829,-	Kč
c) zábradlí	0,00,-	Kč
- Celkové navýšení ceny díla o	+ 191.747,-	Kč

5. Druh změny

Dle §222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ZOZVZ 134/2016 Sb.

6. Fotodokumentace

7. Přílohy

Rozpočet
Statický návrh jeřábové dráhy.

8. Podpisy

Zhotovitel



	Petr Zelinka	
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant


	Ing. Jan Přivratský	
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

	Ing. Jiří Forejtek	
datum	jméno	razítko a podpis

Změnový List		
	Společnost Lanškroun 2022	
Vedoucí Společník: LB 2000, s.r.o U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc IČO: 64618081	„ČOV Lanškroun – stavební úpravy“	Společník: Instav Hlinsko a.s. Tyršova 833, 539 01 Hlinsko IČO: 252 84 959

Objednatel

	Ing. Lubomír Fiedler, MBA	 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350 561 64 Jablonné nad Orlicí
datum	jméno	razítko a podpis


Společnost Lanškroun 2022

Vedoucí společník:
LB 2000, s.r.o.
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČO: 646 18 081

Společník:
Instav Hlinsko a.s.
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČO: 252 84 959

Změnový list

Číslo změnového listu : **2**

Od : Zhotovitel	Společnost Lanškroun 2022													
Komu : Objednatel	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.													
Celkový počet stran :		Celkový počet příloh :												
Stavba :	ČOV Lanškroun - Stavební úpravy													
Objekt :														
Důvod změny, požadavek :	Chybou v PD <input type="checkbox"/>	Záměrem investora, provozovatele, bud. provozovatele <input type="checkbox"/>	Chybou dodavatele <input type="checkbox"/>	Vyšší mocí <input type="checkbox"/>	Jinou okolností- uveďte : <input type="checkbox"/>									
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla a termínů :</p> <table border="0"> <tr> <td>Popis změny :</td> <td>Poklapy nad čerpadla</td> <td>10 918,00 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jeřábová dráha</td> <td>180 829,00 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zábradlí</td> <td>0,00 Kč bez DPH</td> </tr> </table>						Popis změny :	Poklapy nad čerpadla	10 918,00 Kč bez DPH		Jeřábová dráha	180 829,00 Kč bez DPH		Zábradlí	0,00 Kč bez DPH
Popis změny :	Poklapy nad čerpadla	10 918,00 Kč bez DPH												
	Jeřábová dráha	180 829,00 Kč bez DPH												
	Zábradlí	0,00 Kč bez DPH												
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>														
Změna sjednané ceny díla o (- odpočet / + navýšení) :				191 747,00										
Změna sjednané lhůty dokončení díla (- zkrácení / + prodloužení) :														
Vyjádření zpracovatele PD k výše uvedené změně je přiloženo :	Změnou projektové dokumentace <input type="checkbox"/>	Zápisem v SD <input type="checkbox"/>	Zápisem z KD <input type="checkbox"/>	Jiné (fax,e-mail) <input type="checkbox"/>	Není <input type="checkbox"/>									
Za zhotovitele zpracoval :	Ing. Michal Široký													
Datum :	30.06.2023													
Podpis :														
Podpis zmocněnce zhotovitele : LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8 779 00 Olomouc - Holice	Objednatel (oprávněný zástupce objednatele) : Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350 561 64 Jablonné nad Orlicí													
Dne :	Dne: 													

Zpracoval: Ing. Tomáš Svetko
revize: 2
mullář c.21/Prov

Bez potvrzení změny podle ustanovení Smlouvy o dílo nebude dodavatel objednávat materiál, výrobky apod. a nebude provádět žádné práce, dokud neobdrží potvrzení tohoto tiskopisu ze strany objednatele.
Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo.

Fon

ZL 2

Stavba: ČOV Lanškroun - stavební úpravy
Objekt:

Scopis: **Soupis víceprací a méněprací**

Místo: Lanškroun
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Jabloné nad Orlicí, a.s.
Zhotovitel: Společnost Lanškroun 2022

Datum: 08.02.2023
Projektant: VIS s.r.o.
Zpracovatel: Společnost Lanškroun 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

Poklopy nad čerpadla

46 K R - 303.9.4 Zakrytí otvoru ČS sestavou kompozitních poklopů v. 40 mm s rámem 885/985 mm, D+M

Poznámka k položce:
včetně 2 f 103 díl 1,8 m a L 7070 po obvodu ČS z kompozitu

46 Kompozitní rožky + nerez rám

				kpl	-6,000	8 911,00	-53 466,00
				kpl	1,000	64 384,00	64 384,00

Jeřábová dráha

1 Jeřábová dráha

1 Statický výpočet a výkres

Zábradlí

53 M R - 303.9.2 zábradlí ocelové pozinkované v. 1,1 m - SO 01.1 dešťová zdiž

46 M R - 303.9.2 zábradlí ocelové pozinkované v. 1,1 m SO 01.2 Parshallův žlab

53 M R - 303.9.2 zábradlí ocelové nerez v. 1,1 m - SO 01.1 dešťová zdiž

46 M R - 303.9.2 zábradlí ocelové nerez v. 1,1 m SO 01.2 Parshallův žlab

				soubor	1	168 829,00	168 829,00
				soubor	1	12 000,00	12 000,00
							0,00
				m	-28,000	3 564,00	-99 792,00
				m	-22,000	3 564,00	-78 408,00
				m	28,000	3 564,00	99 792,00
				m	22,000	3 564,00	78 408,00

10 918,00

180 829,00




0,00

-99 792,00

-78 408,00

99 792,00

78 408,00

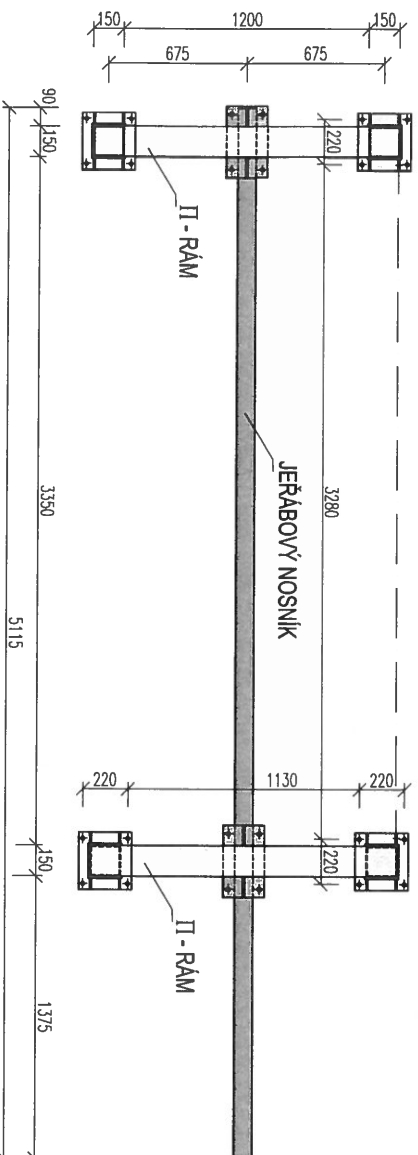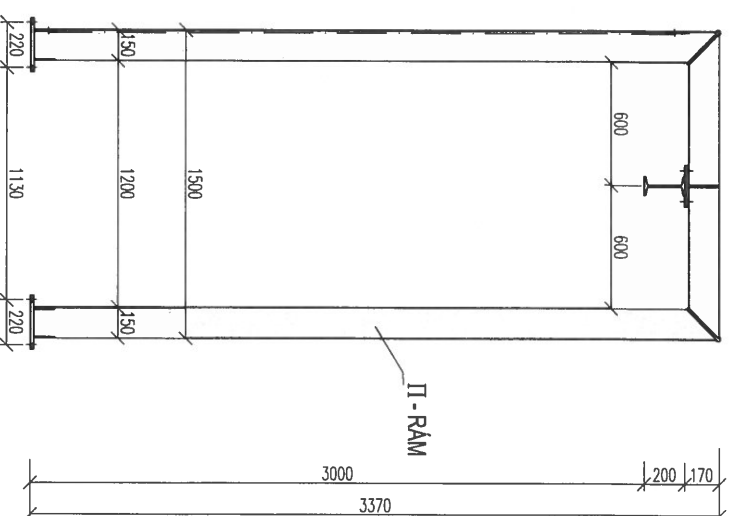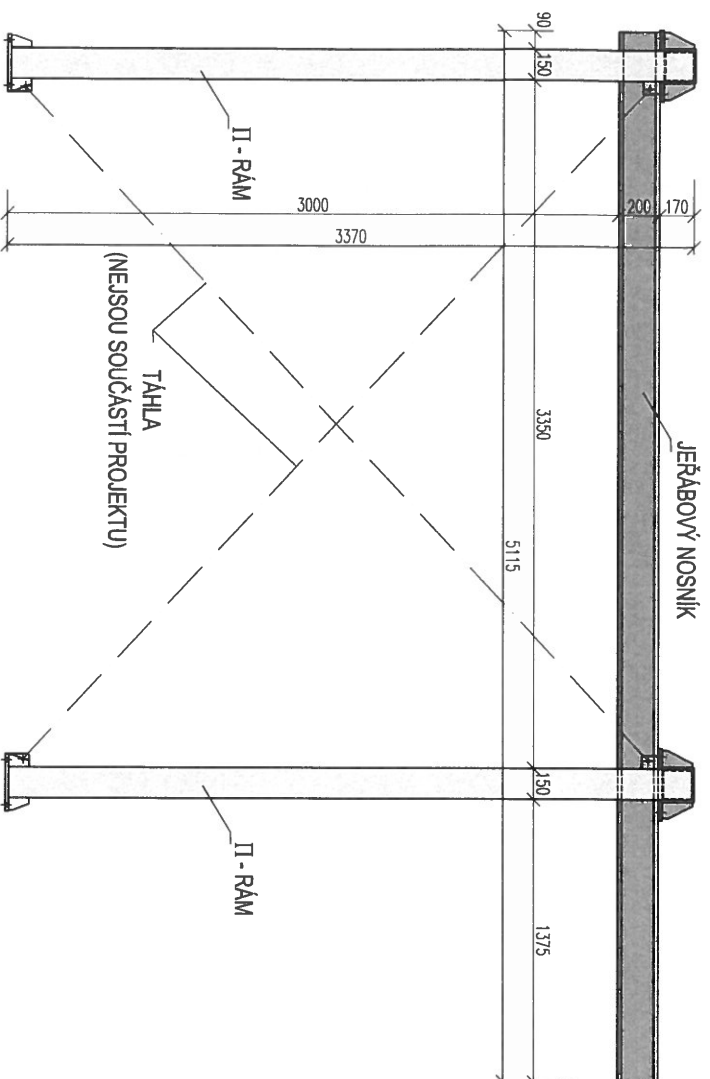

DO BETONU KOTVIT POMOCÍ SVORNIKŮ M16 PEVNOSTNÍ ŘÁDY 8.8.
 SVORNIKY ZALÍT DO BETONU NA CHEMICKOU MALTU DO VRTŮ HLoubKY MIN. 150 mm
 PŘI MONTÁŽI ZAJISTIT SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ II - RÁMY PROTI ZŘÍCENÍ !!!

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		Ing. Miroslav Myslivec	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Jiří Strnad	FORMÁT	A4
VYPRACOVAN		Ing. Jiří Strnad	REVIZE	0
KONTROLOVAL		Ing. Martin Machala, Ph.D.	datum	06/2023
INVESTOR		VAK JABLONNÉ NAD ORLICI, a.s.	STUPEŇ	RDS
PROJEKT		ČOV LANŠKROUN - STAVEBNÍ ÚPRAVY	PÁŘE	
ČÁST/OBJEKT		SO 01 - DEŠŤOVÁ ZDRŽ	MĚŘITKO	1:25
PŘÍLOHA		STATIKA - JERÁBOVÁ DRÁHA - SESTAVA	ČÍSLO PŘÍLOHY	01

SMV projekt, s.r.o.
 sídlo : Školnice 41, 618 00 Brno
 provozovna: Pechova 3, 615 00 Brno
 IČ : 28274474
 telefon : +420 773 524 001
 e-mail : info@smvprojekt.cz
 www.smvprojekt.cz

