Harmonogram stavebních prací

Výměna vodovodu Vsetín Rybníky III.etapa

Stavební práce		zahájení	ukončení
IO01 Výměna vodovodu a přepojení vodovodních přípojek		1.4.2022	30.4.2023
ul.U Trati	Řad 1.6.2	1.4.2022	24.4.2022
	přípojky VP37 až VP42	2.5.2022	12.6.2022
	Řad 1.8.2	19.4.2022	8.5.2022
ul.Příčná	Řad 1.8	2.5.2022	22.5.2022
	přípojky VP47 až VP48	16.5.2022	19.6.2022
ul.Na Rybníkách	Řad 1.6	23.5.2022	12.6.2022
	přípojky VP16 až VP29	13.6.2022	14.8.2022
ul.Na Rovině	Řad 1.8.1	6.6.2022	19.6.2022
	přípojky VP49 až VP54	20.6.2022	24.7.2022
	Řad 1.6.1	13.6.2022	30.6.2022
	přípojky VP30 až VP36	1.7.2022	24.7.2022
ul.Benátky	Řad 1	1.7.2022	31.7.2022
	přípojky VP01 až VP13	1.8.2022	18.9.2022
ul.Na Rybníkách	Řad 1.7	1.8.2022	7.8.2022
	přípojky VP43 až VP46	8.8.2022	18.9.2022
ul.Pod Žamboškou	Řad 1.9	8.8.2022	31.8.2022
	přípojky VP55 až VP57	1.9.2022	16.10.2022
	Řad 1.9.1	1.9.2022	18.9.2022
	přípojky VP58 až VP60	12.9.2022	16.10.2022
	Řad 1.10	12.9.2022	30.9.2022
	přípojky VP61 až VP64	26.9.2022	16.10.2022
ul.Štěpánská	Řad 1	1.10.2022	23.10.2022
	přípojky VP14 až VP15	24.10.2022	13.11.2022
	Řad 1.11	17.10.2022	13.11.2022
	přípojky VP65 až VP68	14.11.2022	18.12.2022
	Řad 1.11.1	14.11.2022	30.11.2022
	přípojky VP69	1.12.2022	18.12.2022
úpravy povrchů, dokončovací práce		1.6.2022	30.4.2023
00 Ostatní a vedlejší práce		od	do
Ostatní a vedlejší práce		1.4.2022	30.4.2023

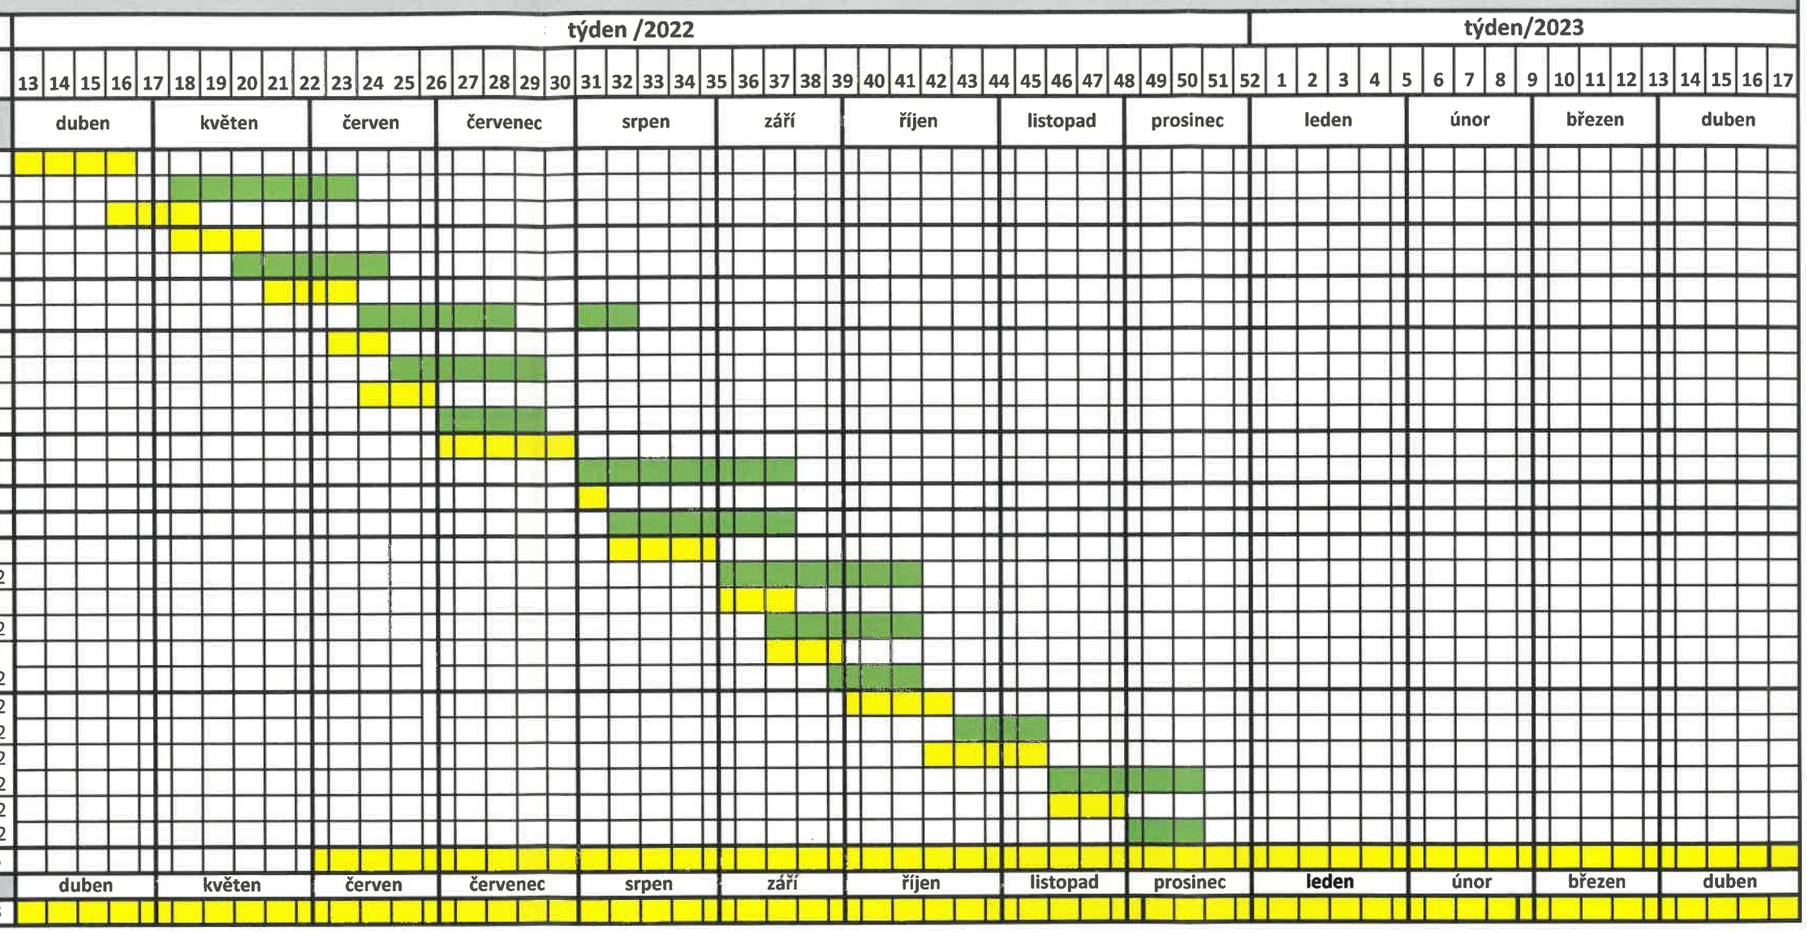

Ve Vsetíně dne 1.3.2022
Libor Otevřel, jednatel OPEN RE-ECO. s.r.o.

OPEN RE-ECO
OPEN RE-ECO, s.r.o./Jiráskova 701
Vsetín 755 01 / Tel.: 571 419 376
IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477
